

2019\_ZG21P

Realizzazione di infrastrutture

Direzione	<b>NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'</b>	Direttore	<b>TARTAGLIA VINCENZO</b>	Classificazione	<b>DIREZIONALE</b>
Servizio	<b>SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITA' E PISTE CICLABILI</b>	Dirigente	<b>CARONE GIUSEPPE</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>

Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2020\_IND\_STRATEG\_01 MOBILITA' INTERMODALE

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2020\_01\_IS\_OB\_STR\_03 GOVERNARE IL TRAFFICO URBANO

**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

2019

L'obiettivo riguarda la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la mobilità, con particolare riferimento a:

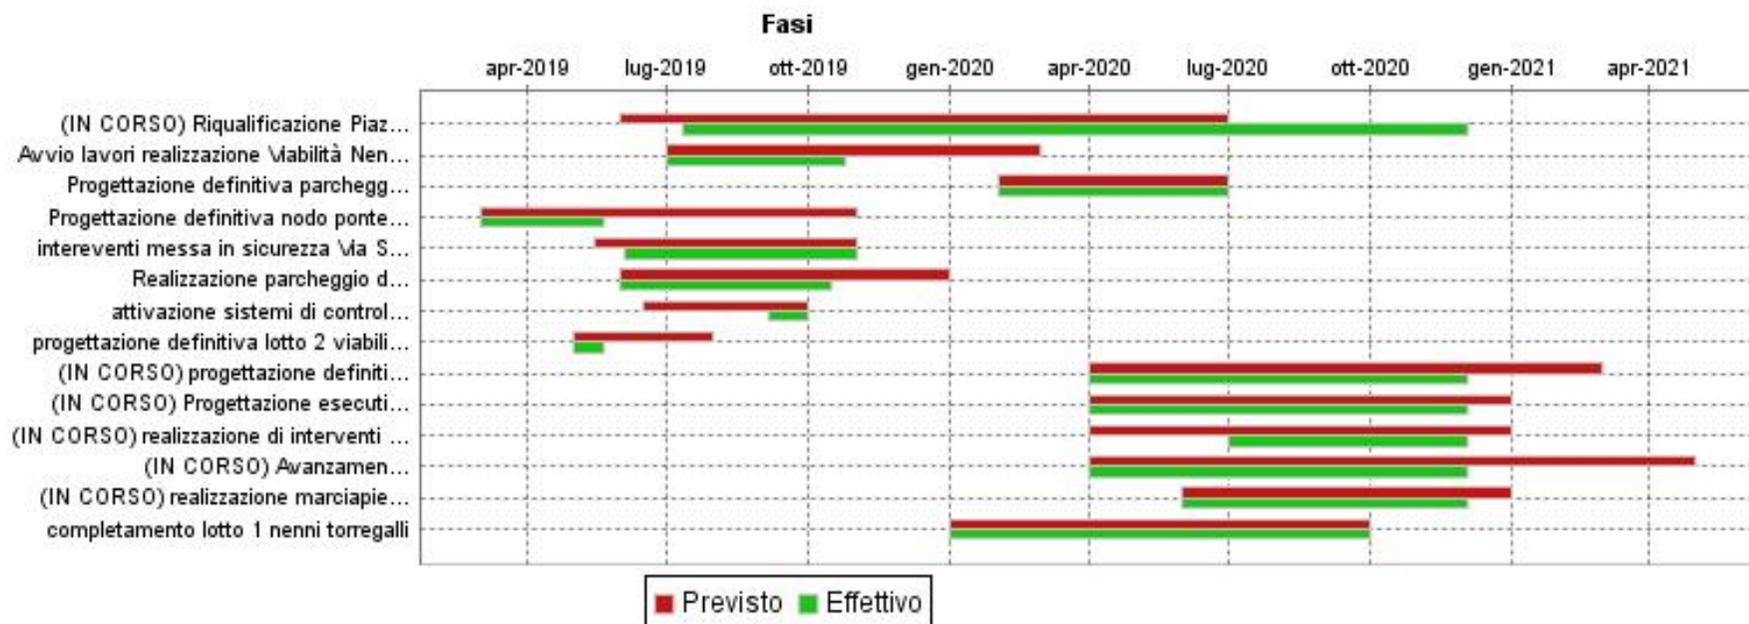
- coordinamento opere di urbanizzazione
- progettazione e realizzazione di parcheggi
- progettazione e realizzazione di interventi per la sicurezza stradale
- progettazione e realizzazione di nuove intersezioni

2020

L'obiettivo riguarda la realizzazione di infrastrutture per la mobilità e la realizzazione di interventi per la sicurezza stradale

Si evidenziano:

- il completamento del lotto 1 della Viabilità Nenni Torregalli
- la realizzazione degli interventi di cui al c.o.170161 "Interventi vari di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano"
- la progettazione del parcheggio di ponte a mensola

**2019\_ZG21P**
**Realizzazione di infrastrutture**
**GANTT**

**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Riqualificazione Piazza Nannotti		01/06/2019	30/06/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	in corso di svolgimento
Avvio lavori realizzazione Viabilità Nenni Torregalli lotto 1		01/07/2019	28/02/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	come da verbale di consegna dei lavori
Progettazione definitiva parcheggio Ponte a Mensola		01/02/2020	30/06/2020	MANNUCCI SIMONE - P.O. PROGET.REALIZ.INFRAS.T.MOB.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	in corso di approvazione con proposta di delibera di giunta 267/2020
Progettazione definitiva nodo ponte a greve – 1° stralcio		01/03/2019	31/10/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	delibera 2019/G/00263 del 20/05/2019
interventi messa in sicurezza Via San Domenico		15/05/2019	31/10/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	opere completate

**2019\_ZG21P**
**Realizzazione di infrastrutture**

<b>FASI</b>						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Realizzazione parcheggio del Meccanotessile		01/06/2019	31/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	approvazione CRE con 2019/DD/09174
attivazione sistemi di controllo (telecamere) su corsia preferenziali TPL		15/06/2019	30/09/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
progettazione definitiva lotto 2 viabilità Nenni Torregalli		01/05/2019	30/07/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	delibera 260/2019 del 20/05/2019
progettazione definitiva rotatoria SR 66 / Via Curzio malaparte		01/04/2020	28/02/2021		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	è connessa con variante urbanistica e procedure espropriative del comune di campi bisenzio
Progettazione esecutiva Collegamento Via Osteria - Via Lucania		01/04/2020	31/12/2020	TONELLI ANDREA - P.O. PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
realizzazione di interventi di sicurezza stradale		01/04/2020	31/12/2020	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	c.o. 170161
Avanzamento progettazione nodo di Ponte a Ema (convenzione Bagno a Ripoli)		01/04/2020	30/04/2021	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
realizzazione marciapiede Via Benedetto Fortini		01/06/2020	31/12/2020	TONELLI ANDREA - P.O. PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
completamento lotto 1 nenni torregalli		01/01/2020	30/09/2020	TONELLI ANDREA - P.O. PROG.REALIZ.INTERV.RIQUALIF.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Realizzazione di interventi infrastrutture stradali	RISULTATO	2
Realizzazione di infrastrutture quali opere di urbanizzazione di piani attuativi e di recupero o altri interventi di riqualificazione urbana coordinati dalla Direzione Urbanistica: approvazione ammissibilità dei collaudi	RISULTATO	100%
Realizzazione di interventi di sicurezza stradale	RISULTATO	5

**2019\_ZG21P****Realizzazione di infrastrutture****INDICATORI**

<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valore Atteso</b>
attivazione telecamere corsie preferenziali	RISULTATO	20
2020 -progettazione infrastrutture	RISULTATO	3,00
2020 -Realizzazione di interventi di sicurezza stradale 2020	RISULTATO	5,00
