

2020_ZV07
Riqualificazione dell'Istituto comprensivo Don Milani quale complesso polifunzionale ad uso civico

Direzione	SERVIZI TECNICI	Direttore	MAZZONI MICHELE	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	GESTIONE E MANUTENZIONE	Dirigente	CIONI FILIPPO	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_03 CRESCERE CON LA SCUOLA

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_03_IS_OB_STR_02 MIGLIORARE STRUTTURE SCOLAST.

**Obiettivo Operativo 3.2.05
del D.U.P.**
**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**


Il Comune di Firenze è risultato beneficiario di un contributo ministeriale per la progettazione dell'intervento di riqualificazione e adeguamento della scuola Don Milani. Nel 2020, sarà dato corso al conferimento di detto servizio per conseguire il livello di progettazione atto alla contrazione del mutuo, ovviamente, con tempistiche riviste a seguito delle criticità di carattere finanziario che sono conseguite alla pandemia da Covid-19.

L'investimento trova collocazione nel PTI 2020/22 approvato per 8 milioni di euro, spalmato su due annualità. La situazione di bilancio post Covid potrebbe modificare tale imputazione. E' prevedibile un aggiornamento in tal senso che l'A.C. potrebbe effettuare in fase di equilibri o assestamento di bilancio.


La dir.Istruzione partecipa all'obb. collaborando con i Servizi Tecnci per la realizzazione dello stesso; le due direzioni, da sempre, operano attivamente e continuamente per favorire lo sviluppo delle attività finalizzate a "crescere con la scuola".

BUDGET
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2020	CP	4	02		155.000,00
2021	CP	6	03		1.000.000,00
Totale Entrate					1.155.000,00


Budget Spesa


		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	2	02		155.000,00
2021	CP	2	05		1.000.000,00
Totale Spesa					1.155.000,00



2020_ZV07

Riqualificazione dell'Istituto comprensivo Don Milani quale complesso polifunzionale ad uso civico

GANTT

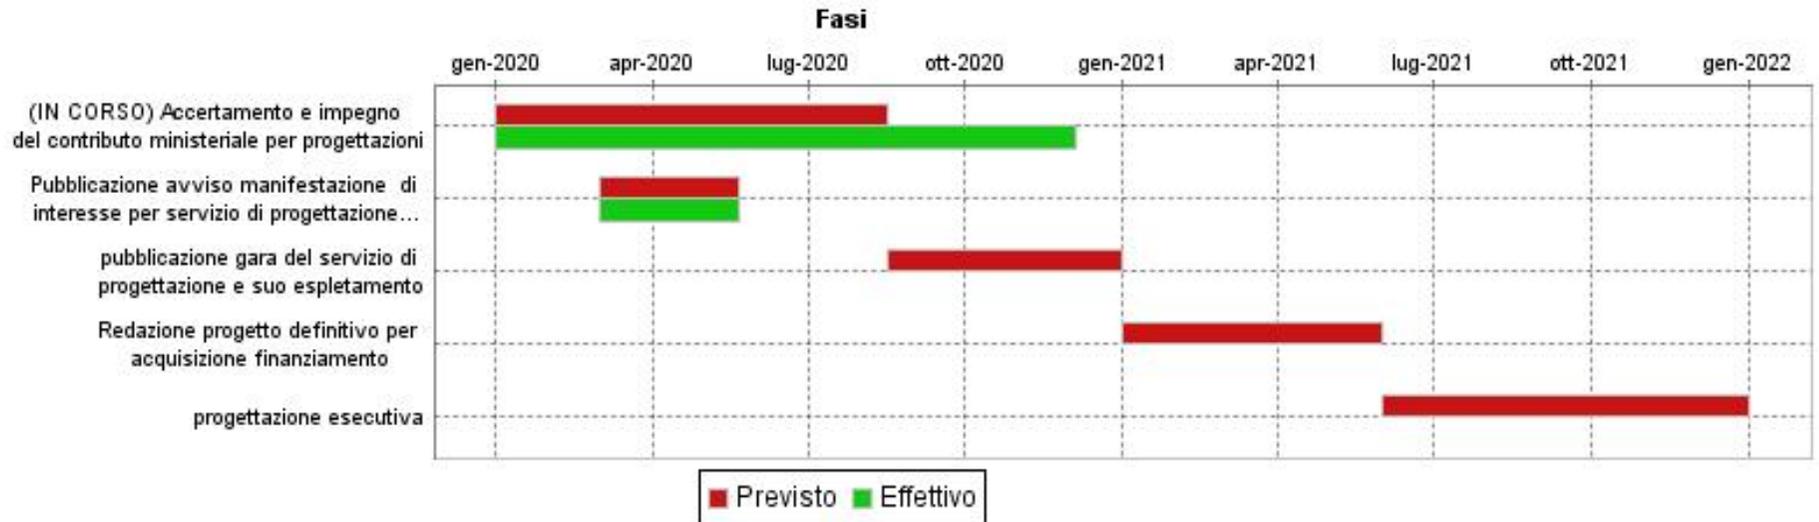

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Accertamento e impegno del contributo ministeriale per progettazioni		01/01/2020	15/08/2020	MANDO ANTONELLA - P.O. PROGRAM.E BILANCIO-INC.PROF	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	necessita variaz. sui tempi- l'acc.e imp. del contributo va effettuato tenendo conto anche del co-finanziamento dell'ente. Trattandosi di opera da finanziare con mutuo va attinto dal fondo dell'anticipazione degli incarichi che alla data del 15.7.2020 no

2020_ZV07

Riqualificazione dell'Istituto comprensivo Don Milani quale complesso polifunzionale ad uso civico

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Pubblicazione avviso manifestazione di interesse per servizio di progettazione - recepimento delle candidature		02/03/2020	21/05/2020	CIONI FILIPPO	SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.	necessita variare la tempistica di fine fase. Questa 2a fase è stata eseguita nonostante le incertezze sull'esito della fase 1a, ovviamente cercando di dilazionare i tempi visto l'esposizione all'esterno, confidando tuttavia nell'accoglimento della varia
pubblicazione gara del servizio di progettazione e suo espletamento		16/08/2020	31/12/2020	CIONI FILIPPO	SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.	Necessita variare tempi di inizio e di fine. Mentre la fase 2 è stata espletata nelle more dello stanziamento del fondo dell'anticipazione, l'esecuz.della 3° fase -che non è prettamente consequenziale alla 2°- lo è invece rispetto alla 1°. Solo se la sp
Redazione progetto definitivo per acquisizione finanziamento		01/01/2021	31/05/2021	CIONI FILIPPO	SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.	Necessita variare tempi di inizio e fine. Vedi nota fase 1 ovvero slittamento dell'incarico di progettazione. VAR.APPROVATA

2020_ZV07

Riqualificazione dell'Istituto comprensivo Don Milani quale complesso polifunzionale ad uso civico

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
progettazione esecutiva		01/06/2021	31/12/2021	CIONI FILIPPO	SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.	Necessita variare tempi di inizio e fine. Vedi nota fase 1 ovvero slittamento dell'incarico di progettazione. Lo slittamento dell'incarico di progettazione si ripercuote su tutte le fasi. La data di inizio prevista (1.1.2020) è un errore materiale; è da i

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Attivazione richiesta per copertura spesa afferente il co-finanziamento della spesa di progettazione	RISULTATO	entro febbraio 2020
Pubblicazione avviso manifestazione di interesse per servizio di progettazione	RISULTATO	entro aprile 2020

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
200178	Intervento di riqualificazione e adeguamento della scuola don Milani via C. Digny - anno 2020 - progettazione RUP: CIONI FILIPPO	155.000,00	155.000,00
200183	Scuola Don Milani via C. Digny - Bonifica e demolizione - anno 2020 RUP: CIONI FILIPPO	1.000.000,00	1.000.000,00
