

2020_ZV07P**Obiettivo pluriennale Riqualificazione dell'Istituto comprensivo Don Milani quale complesso polifunzionale ad uso civico**

Direzione	SERVIZI TECNICI	Direttore	MAZZONI MICHELE	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	GESTIONE E MANUTENZIONE	Dirigente	CIONI FILIPPO	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a


INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_03 CRESCERE CON LA SCUOLA**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2021_03_IS_OB_STR_02 MIGLIORARE STRUTTURE SCOLAST.**Obiettivo Operativo** 3.2.05
del D.U.P.**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Testo 2020: Il Comune di Firenze è risultato beneficiario di un contributo ministeriale per la progettazione dell'intervento di riqualificazione e adeguamento della scuola Don Milani. Nel 2020, sarà dato corso al conferimento di detto servizio per conseguire il livello di progettazione atto alla contrazione del mutuo, ovviamente, con tempistiche riviste a seguito delle criticità di carattere finanziario che sono conseguite alla pandemia da Covid-19.

L'investimento trova collocazione nel PTI 2020/22 approvato per 8 milioni di euro, spalmato su due annualità. La situazione di bilancio post Covid potrebbe modificare tale imputazione. E' prevedibile un aggiornamento in tal senso che l'A.C. potrebbe effettuare in fase di equilibri o assestamento di bilancio.

La dir.Istruzione partecipa all'obb. collaborando con i Servizi Tecnici per la realizzazione dello stesso; le due direzioni, da sempre, operano attivamente e continuamente per favorire lo sviluppo delle attività finalizzate a "crescere con la scuola".

Testo 2021: L'investimento complessivo finalizzato alla riqualificazione dell'istituto comprensivo Don Milani è stato spostato con variazione del 2020 sull'annualità 2021 del bilancio. Attività del 2021 sono costituite, in sintesi, dal conferimento all'esterno del servizio di progettazione, dall'espletamento di questo per addivenire al progetto e all'acquisizione del relativo finanziamento.

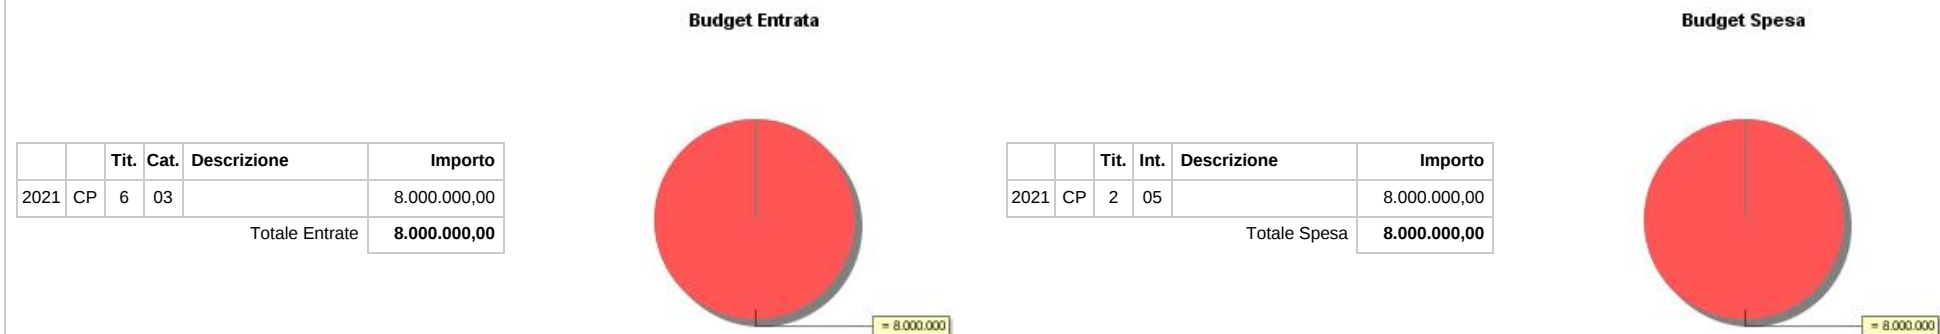2020_ZV07P
Obiettivo pluriennale Riqualificazione dell'Istituto comprensivo Don Milani quale complesso polifunzionale ad uso civico
BUDGET

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo	Entrata	Spesa
200018	Scuola Don Milani via C. Digny - riqualificazione e adeguamento -anno 2021 RUP: CIONI FILIPPO	7.000.000,00	7.000.000,00
200183	Scuola Don Milani via C. Digny - Bonifica e demolizione - anno 2020 RUP: CIONI FILIPPO	1.000.000,00	1.000.000,00

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione
LOMBARDI ANDREA	Personale assegnato all'obiettivo
SIGNORINI ENRICO	Personale assegnato all'obiettivo
RICCI RICCARDO P.O.IMM.STR.COORD.SIC.SISM.E ANTINC	Personale assegnato all'obiettivo
CALDANI GIANLUCA	Personale assegnato all'obiettivo
CALONACI FABIO	Personale assegnato all'obiettivo
CIARDINI LAPO	Personale assegnato all'obiettivo
FERRONI SIMONE - P.O. IMPIAN.MECCAN.EDIF.E SOTTOP.	Personale assegnato all'obiettivo
GIORGI MARCO	Personale assegnato all'obiettivo
LANDI EMILIANO	Personale assegnato all'obiettivo


2020_ZV07P

Obiettivo pluriennale Riqualificazione dell'Istituto comprensivo Don Milani quale complesso polifunzionale ad uso civico

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione
MANDO ANTONELLA - P.O. PROGRAM.E BILANCIO-INC.PROF	Personale assegnato all'obiettivo
MAZZETTI LEONARDO	Personale assegnato all'obiettivo
NESTI FRANCESCO	Personale assegnato all'obiettivo
PICCIOLI FRANCESCA	Personale assegnato all'obiettivo
PINZAUTI MARTINO	Personale assegnato all'obiettivo
RENZULLI ROBERTA	Personale assegnato all'obiettivo

GANTT

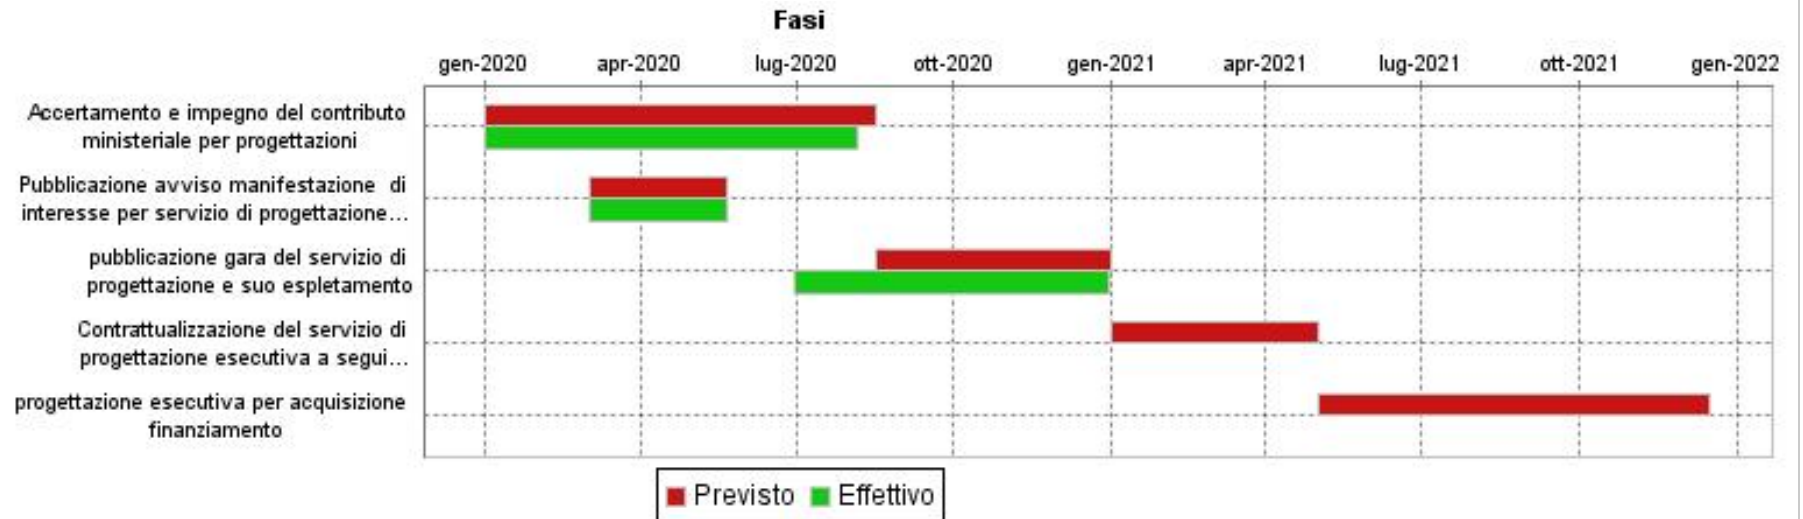

FASI - ATTIVITA'

FASE	Accertamento e impegno del contributo ministeriale per progettazioni					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
	01/01/2020	15/08/2020	5,00	100,00	MANDO ANTONELLA - P.O. PROGRAM.E BILANCIO-INC.PROF	DIREZIONE SERVIZI TECNICI
	01/01/2020	05/08/2020				

2020_ZV07P

Obiettivo pluriennale Riqualificazione dell'Istituto comprensivo Don Milani quale complesso polifunzionale ad uso civico

	Note	necessita variaz. sui tempi- l'acc.e imp. del contributo va effettuato tenendo conto anche del co-finanziamento dell'ente. Trattandosi di opera da finanziare con mutuo va attinto dal fondo dell'anticipazione degli incarichi che alla data del 15.7.2020 no				
FASE	Pubblicazione avviso manifestazione di interesse per servizio di progettazione - recepimento delle candidature					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
	02/03/2020	21/05/2020				
	02/03/2020	21/05/2020				
	Note	necessita variare la tempistica di fine fase. Questa 2a fase è stata eseguita nonostante le incertezze sull'esito della fase 1a, ovviamente cercando di dilazionare i tempi visto l'esposizione all'esterno, confidando tuttavia nell'accoglimento della varia				
FASE	pubblicazione gara del servizio di progettazione e suo espletamento					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
	16/08/2020	31/12/2020				
	30/06/2020	29/12/2020				
	Note	Necessita variare tempi di inizio e di fine. Mentre la fase 2 è stata espletata nelle more dello stanziamento del fondo dell'anticipazione, l'esecuz.della 3° fase -che non è prettamente consequenziale alla 2°- lo è invece rispetto alla 1°. Solo se la sp				
FASE	Contrattualizzazione del servizio di progettazione esecutiva a seguito dell'aggiudicazione formalizzata a dine 2020					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
	01/01/2021	30/04/2021				
	Note					
FASE	progettazione esecutiva per acquisizione finanziamento					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
	01/05/2021	15/12/2021				
	Note					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2020 - Attivazione richiesta per copertura spesa afferente il co-finanziamento della spesa di progettazione	RISULTATO	entro febbraio 2020	5/2/2020

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
