

2020\_Z513P

**Obiettivo pluriennale Masterplan Cascine – Interventi strutturali e infrastrutturali per il miglioramento ambientale del Parco (Emissario in riva destra d’Arno II lotto, Ex Meccanò, Porto Leopoldino). Triennio 2020-22. Interventi sull’Area Ex Gover Gover**

Direzione	<b>GENERALE</b>	Direttore	<b>PARENTI GIACOMO</b>	Classificazione	<b>INTERDIREZIONALE</b>
Servizio	<b>DIREZIONE GENERALE</b>	Dirigente	<b>PALLADINO DOMENICO</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>

Collegato a

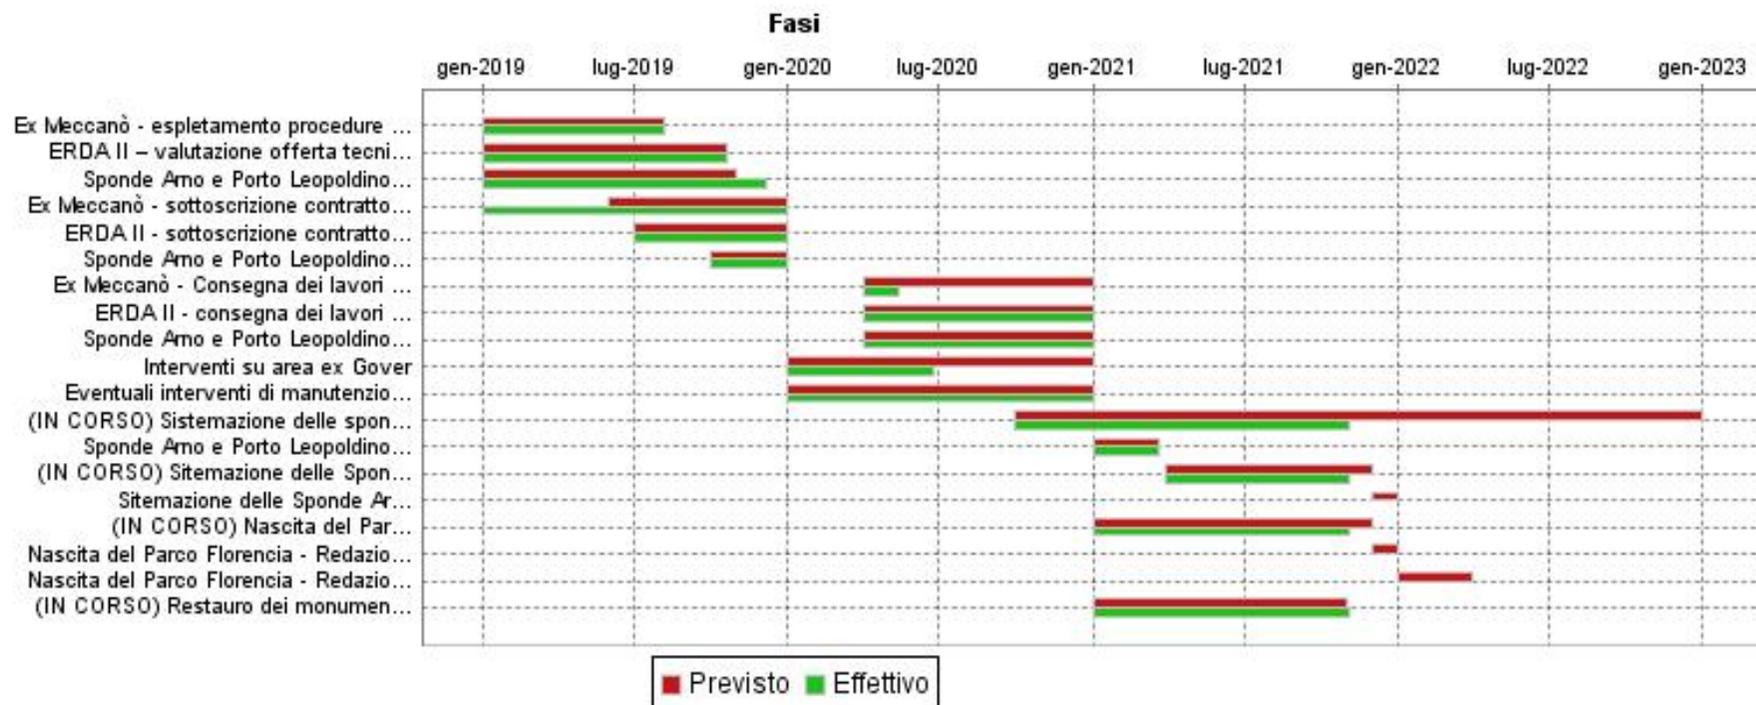
**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2021\_IND\_STRATEG\_02 FIRENZE VERDE E ECOSOSTENIBILE

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2021\_02\_IS\_OB\_STR\_01 PARCHI URBANI E AREE VERDI

**Obiettivo Operativo** 2.1.07 - 2.1.27  
**del D.U.P.**

**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

Valorizzazione ulteriore del Parco delle Cascine estendendolo fino all'Argingrosso.  
Favorire la nascita del "Parco Florentia" includendovi le aree di Santa Maria a Mantignano e integrando il nuovo parco con quelli delle Cascine dei Renai.  
L'obiettivo consiste nel miglioramento ambientale e nell'ampliamento dell'offerta di verde pubblico e servizi nel Parco delle Cascine e verrà perseguito attraverso la realizzazione di alcuni interventi strutturali e infrastrutturali consistenti: nel II lotto di interventi di completamento dell'emissario in riva destra d'Arno, nel recupero dell'area un tempo occupata dalla discoteca Meccanò con l'attribuzione della funzione di "porta del Parco", nella sistemazione delle sponde dell'Arno nel tratto compreso fra Ponte alla Vittoria e il ponte della tramvia, compresa la ricostruzione del Porto Leopoldino.

**2020\_Z513P**
**Obiettivo pluriennale Masterplan Cascine – Interventi strutturali e infrastrutturali per il miglioramento ambientale del Parco (Emissario in riva destra d'Arno II lotto, Ex Meccanò, Porto Leopoldino). Triennio 2020-22. Interventi sull'Area Ex Gover Gover**
**GANTT**

**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Ex Meccanò - espletamento procedure di gara e aggiudicazione contratto	5,00	01/01/2019	05/08/2019	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	
ERDA II – valutazione offerta tecnica, apertura offerte economiche e aggiudicazione contratto	5,00	01/01/2019	20/10/2019	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	complessità dell'appalto, necessità di subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta tecnica ed economica

**2020\_Z513P**
**Obiettivo pluriennale Masterplan Cascine – Interventi strutturali e infrastrutturali per il miglioramento ambientale del Parco (Emissario in riva destra d’Arno II lotto, Ex Meccanò, Porto Leopoldino). Triennio 2020-22. Interventi sull’Area Ex Gover Gover**

<b>FASI</b>						
<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Note</b>
Sponde Arno e Porto Leopoldino - Aggiornamento progettazione esecutiva - Stralcio Oratorio San Carlo	5,00	01/01/2019	31/10/2019	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	necessità di eseguire ulteriori approfondimenti in materia di sicurezza idraulica
Ex Meccanò - sottoscrizione contratto e consegna lavori	5,00	01/06/2019	31/12/2019	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	avviata la procedura di sottoscrizione del contratto e consegna dei lavori nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, co. 9, del d.lgs. 50/2016
ERDA II - sottoscrizione contratto e consegna lavori	5,00	01/07/2019	31/12/2019	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	complessità dell'appalto, necessità di subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta tecnica ed economica - avviata la procedura di sottoscrizione del contratto e consegna dei lavori nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, co. 9, del d.l
Sponde Arno e Porto Leopoldino – verifica e validazione del progetto, invio all’approvazione del progetto appaltabile	5,00	01/10/2019	31/12/2019	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	
Ex Meccanò - Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere		01/04/2020	31/12/2020	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	
ERDA II - consegna dei lavori ed esecuzione delle opere		01/04/2020	31/12/2020	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	
Sponde Arno e Porto Leopoldino - Aggiornamento progettazione esecutiva - Stralcio Oratorio San Carlo - aggiudicazione dell'appalto ed esecuzione delle opere		01/04/2020	31/12/2020	COCCHI MARCELLO	DIREZIONE AMBIENTE	
Interventi su area ex Gover		01/01/2020	31/12/2020	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	
Eventuali interventi di manutenzione straordinaria sui monumenti minori		01/01/2020	31/12/2020	CASELLI GIORGIO	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	

**2020\_Z513P**
**Obiettivo pluriennale Masterplan Cascine – Interventi strutturali e infrastrutturali per il miglioramento ambientale del Parco (Emissario in riva destra d'Arno II lotto, Ex Meccanò, Porto Leopoldino). Triennio 2020-22. Interventi sull'Area Ex Gover Gover**

<b>FASI</b>						
<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Note</b>
Sistemazione delle sponde del Porto Leopoldino		30/09/2020	31/12/2022	PALLADINO DOMENICO	DIREZIONE AMBIENTE	Variazione responsabile fase a seguito D.S. 25/2021
Sponde Arno e Porto Leopoldino - Perimetrazione d'intervento e sopralluoghi preliminari		01/01/2021	19/03/2021	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	
Sistemazione delle Sponde Arno compreso costruzione Porto Leopoldino - Redazione progetto definitivo		30/03/2021	30/11/2021		SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E BONIF	
Sistemazione delle Sponde Arno compreso costruzione Porto Leopoldino - Redazione progetto esecutivo		01/12/2021	31/12/2021		SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E BONIF	
Nascita del Parco Florencia - Redazione del Progetto di fattibilità tecnico ed economica		01/01/2021	30/11/2021		SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E BONIF	
Nascita del Parco Florencia - Redazione del Progetto definitivo		01/12/2021	31/12/2021		SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E BONIF	
Nascita del Parco Florencia - Redazione del Progetto esecutivo		01/01/2022	31/03/2022		SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E BONIF	
Restauro dei monumenti minori		01/01/2021	31/10/2021	CASELLI GIORGIO	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	
<b>INDICATORI</b>						
<b>Descrizione</b>			<b>Tipo</b>	<b>Valore Atteso</b>		
(2020) Lavori consegnati (Ex Meccanò ed ERDA II)			RISULTATO	2		
(2020) Realizzazione di tagli vegetazione infestante e rimozione rifiuti dell'Area ex Gover			RISULTATO	31/12/2020		
(2021) Redazione progetti per la Nascita del Parco Florencia: Numero atti previsti/Numero atti predisposti			PERFORMANCE	2/2		
(2021) Conclusione lavori su monumenti minori			RISULTATO	31/10/2021		
(2022) Redazione progetti per la sistemazione delle sponde del Porto Leopoldino			RISULTATO	31/12/2022		
