

2022_ZG38

Progettazione e realizzazione delle opere viarie connesse alla Linea tramviaria 4.1: nuova viabilità Pistoiese-Rosselli, Parcheggio scambiatore Svincolo Indiano, nuova viabilità delle Piagge

Direzione	SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	Dirigente	PRIORE MICHELE	Tipologia	SVILUPPO

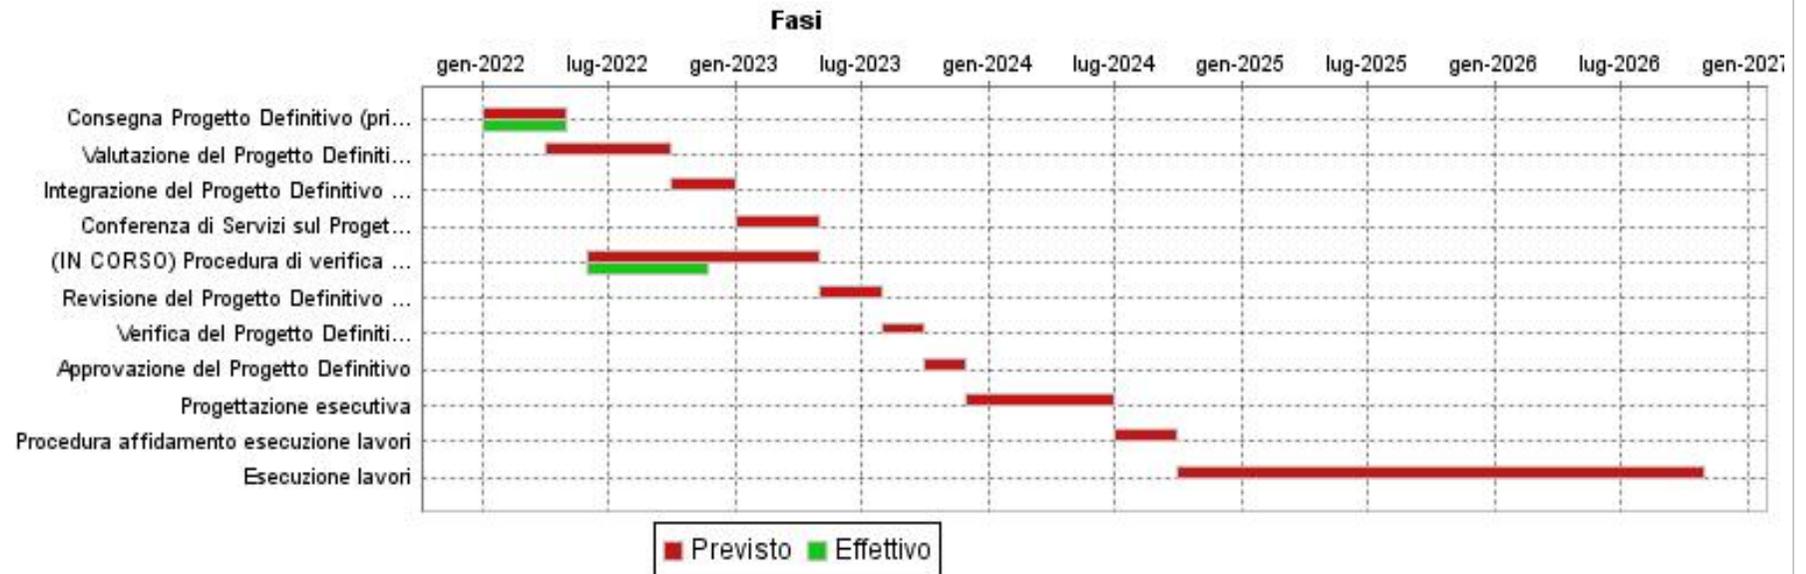
Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.

Obiettivo Operativo 1.2.16
del D.U.P. 1.2.24
 1.2.26
 1.3.19

Descrizione dettagliata dell'obiettivo 2022
 L'Amministrazione comunale ha richiesto la progettazione di una serie di opere viarie connesse alla Linea tramviaria 4.1 Leopolda-Piagge, in particolare: nuova viabilità Pistoiese-Rosselli, parcheggio scambiatore Svincolo Indiano, nuova viabilità delle Piagge. Le attività dell'ufficio consistono nel ruolo di RUP e supporto al RUP, affidamento, coordinamento, supervisione e verifica della progettazione e dello svolgimento delle prestazioni affidate a soggetti esterni.
 Nel corso del 2022 si prevede l'avvio delle procedure approvative del progetto definitivo dell'intervento.

2022_ZG38
Progettazione e realizzazione delle opere viarie connesse alla Linea tramviaria 4.1: nuova viabilità Pistoiese-Rosselli, Parcheggio scambiatore Svincolo Indiano, nuova viabilità delle Piagge
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Consegna Progetto Definitivo (prima stesura)		01/01/2022	30/04/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Valutazione del Progetto Definitivo (prima stesura) tramite coinvolgimento dei Servizi comunali		01/04/2022	30/09/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Integrazione del Progetto Definitivo in esito alle valutazioni dei Servizi comunali		01/10/2022	31/12/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	

2022_ZG38
Progettazione e realizzazione delle opere viarie connesse alla Linea tramviaria 4.1: nuova viabilità Pistoiese-Rosselli, Parcheggio scambiatore Svincolo Indiano, nuova viabilità delle Piagge

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Conferenza di Servizi sul Progetto Definitivo		01/01/2023	30/04/2023	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA		01/06/2022	30/04/2023	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Revisione del Progetto Definitivo in esito a CdS e procedura di VIA		01/05/2023	31/07/2023	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Verifica del Progetto Definitivo revisionato		01/08/2023	30/09/2023	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Approvazione del Progetto Definitivo		01/10/2023	30/11/2023	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Progettazione esecutiva		01/12/2023	30/06/2024	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Procedura affidamento esecuzione lavori		01/07/2024	30/09/2024	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Esecuzione lavori		01/10/2024	30/10/2026	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Consegna del Progetto Definitivo (prima stesura)	RISULTATO	100%

2022_ZG38

Progettazione e realizzazione delle opere viarie connesse alla Linea tramviaria 4.1: nuova viabilità Pistoiese-Rosselli, Parcheggio scambiatore Svincolo Indiano, nuova viabilità delle Piagge

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Convocazione di incontro tecnico di valutazione del Progetto tra Servizi comunali	RISULTATO	100%
Affidamento incarico di verifica della progettazione	RISULTATO	100%
Convocazione della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo	RISULTATO	100%
Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA	RISULTATO	100%
