

2019_ZG20P

Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITA' E PISTE CICLABILI	Dirigente	CARONE GIUSEPPE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_01_IS_OB_STR_04 MOBILITA CICLAB.E SHARING CITY

Obiettivo Operativo 1.4.01 - 1.4.02 - 1.4.04
del D.U.P.

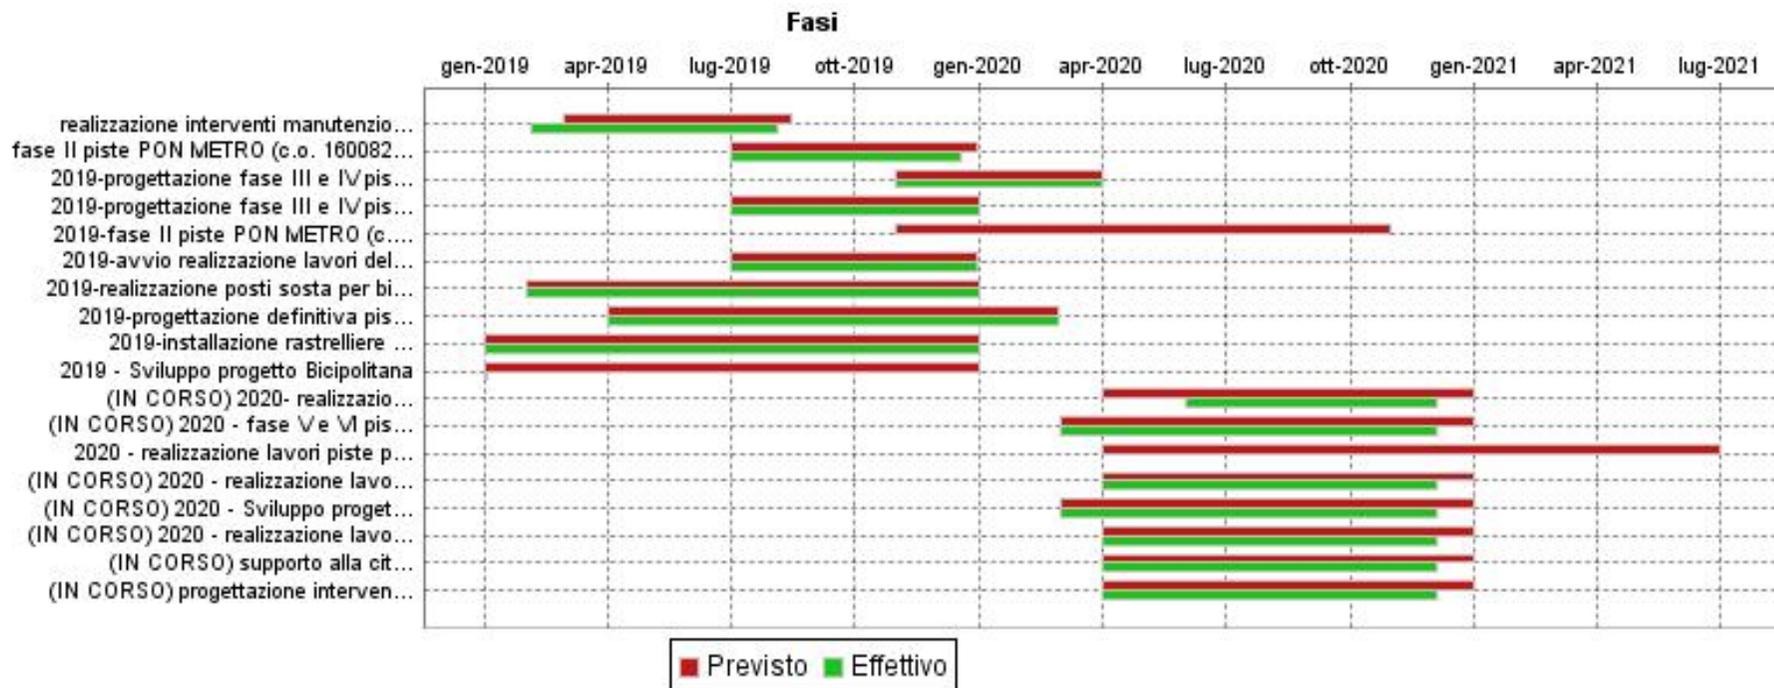
Descrizione dettagliata dell'obiettivo

2019

L'obiettivo rappresenta l'insieme delle attività necessarie per l'implementazione dei percorsi ciclabili cittadini, per la realizzazione di interventi messa in sicurezza e riqualificazione dei percorsi ciclabili esistenti, nonché l'incremento del numero di rastrelliere.

2020

Come per gli anni precedenti l'obiettivo riassume l'azione dell'amministrazione comunale per gli aspetti legati alla sicurezza stradale ed alla ciclabilità: rispetto al primo tema mediante la realizzazione di interventi localizzati (previa analisi delle criticità e coordinamento con l'Ufficio di Sicurezza Stradale), rispetto al secondo tema con lo sviluppo a la riqualificazione della rete di piste ciclabili e rastrelliere, anche a mezzo dell'utilizzo delle risorse del PON METRO

2019_ZG20P
Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
realizzazione interventi manutenzione straordinaria di piste ciclabili - interventi con C.O. 150060		01/03/2019	15/08/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	come da verbale di fine lavori
fase II piste PON METRO (c.o. 160082): progettazione esecutiva		01/07/2019	30/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	mail del 18/12/2019 di Abacus SrL per la trasmissione degli elaborati
2019-progettazione fase III e IV piste PON METRO (c.o. 160084 - 160085): esecuzione della procedura di gara		01/11/2019	31/03/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	

2019_ZG20P

Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2019-progettazione fase III e IV piste PON METRO (c.o. 160084 - 160085): progetto esecutivo		01/07/2019	31/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	nota prot. 419053/2019 trasmissione elaborati fase 3 nota prto. 419660/2019 trasmissione elaborati fase 4
2019-fase II piste PON METRO (c.o. 160036): esecuzione della procedura di gara		01/11/2019	30/10/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2019-avvio realizzazione lavori della ciclopista dell'Arno - tratto lungarno vespucci		01/07/2019	30/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2019-realizzazione posti sosta per bike sharing		31/01/2019	31/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2019-progettazione definitiva pista ciclabile di Via Canova		01/04/2019	28/02/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	come da mail del progettista ing. Nistri
2019-installazione rastrelliere ed interventi manutentivi piste ciclabili		01/01/2019	31/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	avanzamento accordo quadro c.o. 170430
2019 - Sviluppo progetto Bicipolitana		01/01/2019	31/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2020- realizzazione interventi manutenzione straordinaria di piste ciclabili - interventi con C.O. 170162		01/04/2020	31/12/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2020 - fase V e VI piste PON METRO (c.o. 1600VI82): progettazione		01/03/2020	31/12/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2020 - realizzazione lavori piste pon metro fase 2 (c.o. 160082)		01/04/2020	30/06/2021		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2020 - realizzazione lavori piste pon metro fase 3 (c.o. 160083)		01/04/2020	31/12/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	appalto aggiudicato impresa D.F. strade Srl
2020 - Sviluppo progetto Bicipolitana		01/03/2020	31/12/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2020 - realizzazione lavori piste pon metro fase 4 (c.o. 160084)		01/04/2020	31/12/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	appalto aggiudicato impresa Berti Sisto
supporto alla città metropolitana per la realizzazione della superstrada ciclabile		01/04/2020	31/12/2020	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	

2019_ZG20P

Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
progettazione interventi connesse con monetizzazioni piano di recupero		01/04/2020	31/12/2020	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	Ats Via Madonna della Tosse

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2019-N. installazione posti bici	RISULTATO	1.000,00
2019-Realizzazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml)	RISULTATO	500,00
2019-progettazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml)	RISULTATO	4.000,00
2019-programmazione interventi progetto Bicipolitana	RISULTATO	1
2019 - manutenzione piano rotolamento percorsi ciclabili (sviluppo in km)	RISULTATO	1
2020-N. installazione posti bici	RISULTATO	300
2020-Realizzazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml)	RISULTATO	1500
2020 -progettazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml)	RISULTATO	2000
2020 - REALIZZAZIONE interventi progetto Bicipolitana	RISULTATO	3
2020 - manutenzione piano rotolamento percorsi ciclabili (sviluppo in ml)	RISULTATO	1500
2020 - Conferenze dei servizi per approvazione progetti	RISULTATO	2
