

2020_Z513

Masterplan Cascine – Interventi strutturali e infrastrutturali per il miglioramento ambientale del Parco (Emissario in riva destra d’Arno II lotto, Ex Meccanò, Porto Leopoldino). Triennio 2020-2022. Interventi sull’Area Ex Gover Gover

Direzione	GENERALE	Direttore	PARENTI GIACOMO	Classificazione	INTERDIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE GENERALE	Dirigente	PALLADINO DOMENICO	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_02 FIRENZE VERDE E ECOSOSTENIBILE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_02_IS_OB_STR_01 PARCHI URBANI E AREE VERDI

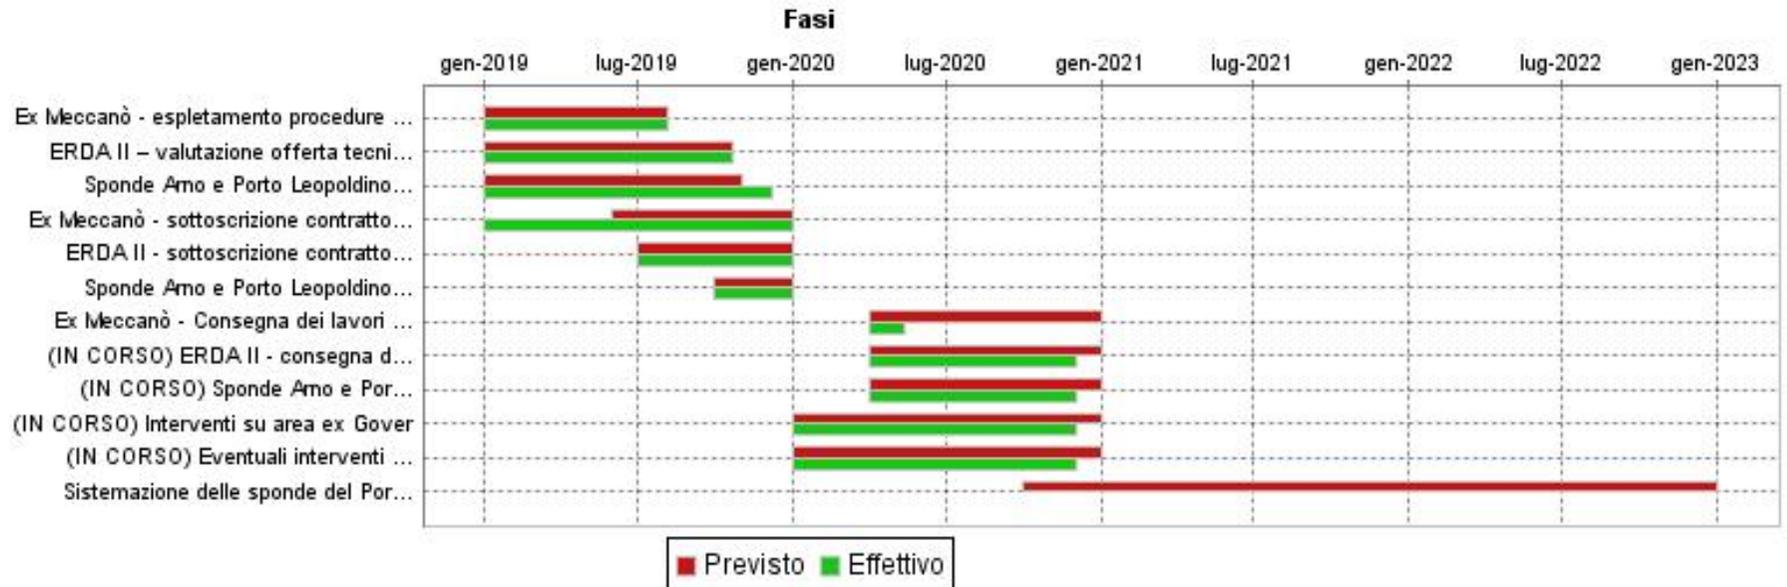
Obiettivo Operativo 2.1.07 - 2.1.27
del D.U.P.

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Valorizzazione ulteriore del Parco delle Cascine estendendolo fino all'Argingrosso.

Favorire la nascita del "Parco Florentia" includendovi le aree di Santa Maria a Mantignano e integrando il nuovo parco con quelli delle Cascine dei Renai.

L'obiettivo consiste nel miglioramento ambientale e nell'ampliamento dell'offerta di verde pubblico e servizi nel Parco delle Cascine e verrà perseguito attraverso la realizzazione di alcuni interventi strutturali e infrastrutturali consistenti: nel II lotto di interventi di completamento dell'emissario in riva destra d'Arno, nel recupero dell'area un tempo occupata dalla discoteca Meccanò con l'attribuzione della funzione di "porta del Parco", nella sistemazione delle sponde dell'Arno nel tratto compreso fra Ponte alla Vittoria e il ponte della tramvia, compresa la ricostruzione del Porto Leopoldino.

2020_Z513
Masterplan Cascine – Interventi strutturali e infrastrutturali per il miglioramento ambientale del Parco (Emissario in riva destra d'Arno II lotto, Ex Meccanò, Porto Leopoldino). Triennio 2020-2022. Interventi sull'Area Ex Gover Gover
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Ex Meccanò - espletamento procedure di gara e aggiudicazione contratto	5,00	01/01/2019	05/08/2019	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	
ERDA II – valutazione offerta tecnica, apertura offerte economiche e aggiudicazione contratto	5,00	01/01/2019	20/10/2019	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	complessità dell'appalto, necessità di subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta tecnica ed economica
Sponde Arno e Porto Leopoldino - Aggiornamento progettazione esecutiva - Stralcio Oratorio San Carlo	5,00	01/01/2019	31/10/2019	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	necessità di eseguire ulteriori approfondimenti in materia di sicurezza idraulica

2020_Z513
Masterplan Cascine – Interventi strutturali e infrastrutturali per il miglioramento ambientale del Parco (Emissario in riva destra d'Arno II lotto, Ex Meccanò, Porto Leopoldino). Triennio 2020-2022. Interventi sull'Area Ex Gover Gover

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Ex Meccanò - sottoscrizione contratto e consegna lavori	5,00	01/06/2019	31/12/2019	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	avviata la procedura di sottoscrizione del contratto e consegna dei lavori nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, co. 9, del d.lgs. 50/2016
ERDA II - sottoscrizione contratto e consegna lavori	5,00	01/07/2019	31/12/2019	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	complessità dell'appalto, necessità di subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta tecnica ed economica - avviata la procedura di sottoscrizione del contratto e consegna dei lavori nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, co. 9, del d.l
Sponde Arno e Porto Leopoldino – verifica e validazione del progetto, invio all'approvazione del progetto appaltabile	5,00	01/10/2019	31/12/2019	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	
Ex Meccanò - Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere		01/04/2020	31/12/2020	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	
ERDA II - consegna dei lavori ed esecuzione delle opere		01/04/2020	31/12/2020	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	
Sponde Arno e Porto Leopoldino - Aggiornamento progettazione esecutiva - Stralcio Oratorio San Carlo - aggiudicazione dell'appalto ed esecuzione delle opere		01/04/2020	31/12/2020	COCCHI MARCELLO	DIREZIONE AMBIENTE	
Interventi su area ex Gover		01/01/2020	31/12/2020	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	
Eventuali interventi di manutenzione straordinaria sui monumenti minori		01/01/2020	31/12/2020	CASELLI GIORGIO	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	
Sistemazione delle sponde del Porto Leopoldino		30/09/2020	31/12/2022	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Lavori consegnati (Ex Meccanò ed ERDA II)	RISULTATO	2

2020_Z513

Masterplan Cascine – Interventi strutturali e infrastrutturali per il miglioramento ambientale del Parco (Emissario in riva destra d’Arno Il lotto, Ex Meccanò, Porto Leopoldino). Triennio 2020-2022. Interventi sull’Area Ex Gover Gover

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Realizzazione di tagli vegetazione infestante e rimozione rifiuti dell'Area ex Gover	RISULTATO	31/12/2020
Redazione progetti per la sistemazione delle sponde del Porto Leopoldino	RISULTATO	31/12/2022
