

2019\_ZG20P21

Obiettivo pluriennale Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

Direzione	<b>NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'</b>	Direttore	<b>TARTAGLIA VINCENZO</b>	Classificazione	<b>DIREZIONALE</b>
Servizio	<b>SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITA' E PISTE CICLABILI</b>	Dirigente	<b>CARONE GIUSEPPE</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>

Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2021\_IND\_STRATEG\_01 MOBILITA' INTERMODALE

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2021\_01\_IS\_OB\_STR\_04 MOBILITA CICLAB.E SHARING CITY

**Obiettivo Operativo** 1.4.01  
**del D.U.P.**

**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

2021

L'obiettivo rappresenta l'insieme delle attività necessarie per l'implementazione dei percorsi ciclabili cittadini, per la riqualificazione dei percorsi ciclabili esistenti, nonché l'incremento del numero di rastrelliere.

Gli indicatori quindi misurano quantitativamente i suddetti elementi

Per quanto riguarda le attività si fa riferimento a specifici appalti di realizzazione dei percorsi ciclabili, nonché attività progettuali delle ciclovie finanziate dal MIT ed i progetti di fattibilità tecnico-economica relativi ai tratti di Bicipolitana non ancora realizzati

Completamento lavori appalto Fase III pon metro - codice opera 160083

Completamento lavori appalto Fase IV pon metro - codice opera 160084

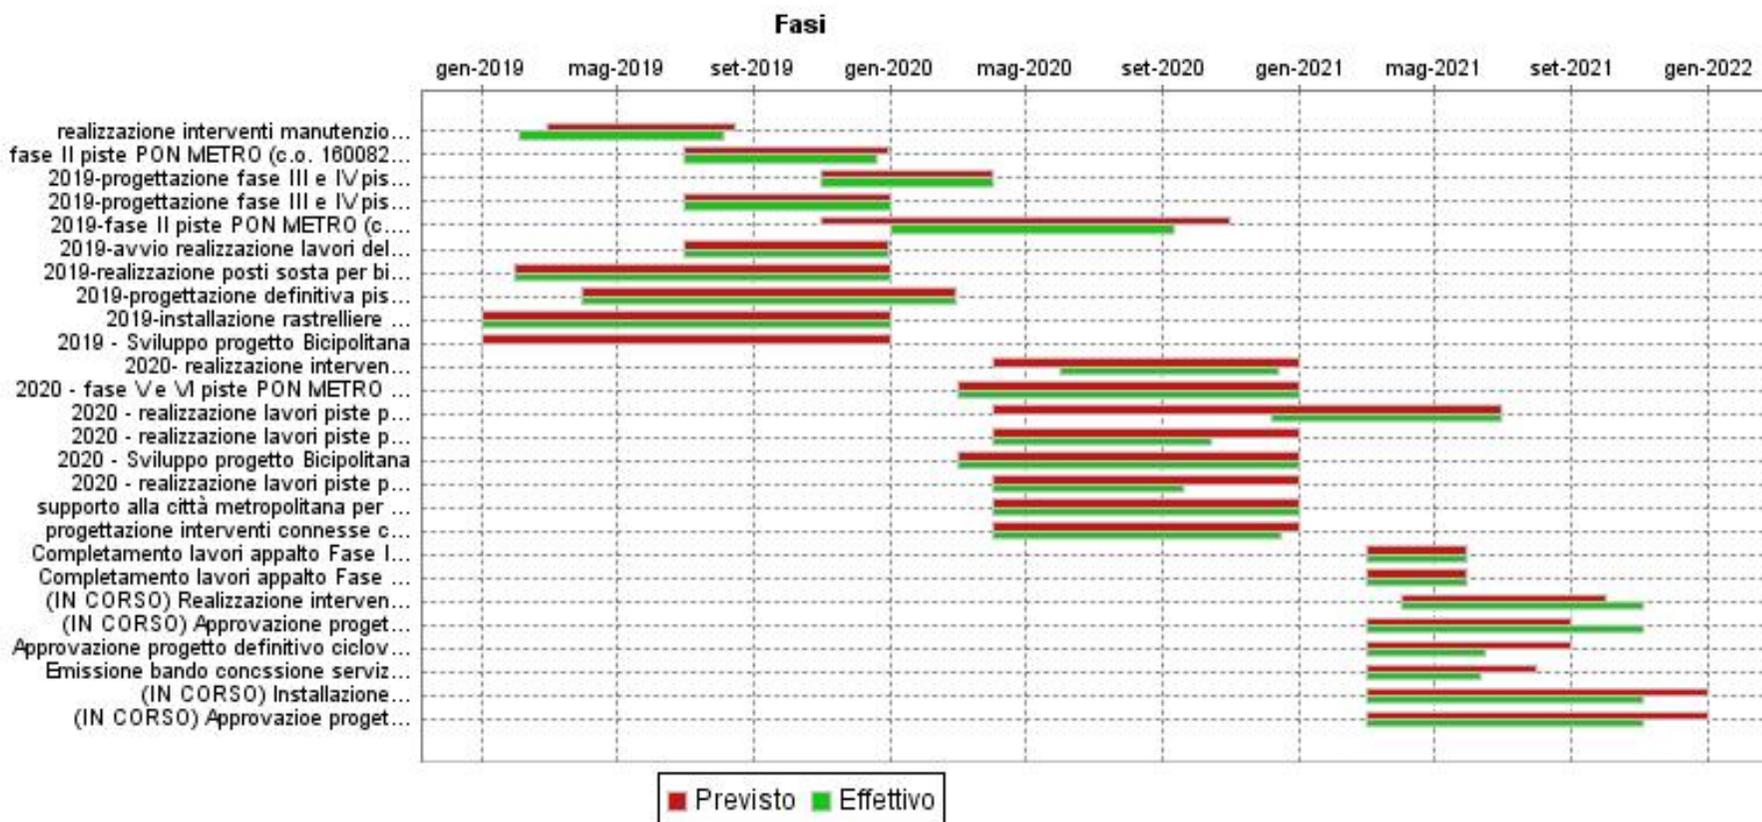
Realizzazione interventi manutenzione pista Ciclabili Erbosa, Adone Zoli, Pascoli

Installazione e manutenzione rastrelliere

Approvazione progetto definitivo ciclovie urbane fase I

Approvazione progetto definitivo ciclovie urbane fase II

Approvazione progetti preliminari linee bicipolitana

**2019\_ZG20P21**
**Obiettivo pluriennale Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile**
**GANTT**

**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
realizzazione interventi manutenzione straordinaria di piste ciclabili - interventi con C.O. 150060		01/03/2019	15/08/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	come da verbale di fine lavori
fase II piste PON METRO (c.o. 160082): progettazione esecutiva		01/07/2019	30/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	mail del 18/12/2019 di Abacus Srl per la trasmissione degli elaborati

**2019\_ZG20P21**
**Obiettivo pluriennale Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile**

<b>FASI</b>						
<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Note</b>
2019-progettazione fase III e IV piste PON METRO (c.o. 160084 - 160085): esecuzione della procedura di gara		01/11/2019	31/03/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2019-progettazione fase III e IV piste PON METRO (c.o. 160084 - 160085): progetto esecutivo		01/07/2019	31/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	nota prot. 419053/2019 trasmissione elaborati fase 3 nota prto. 419660/2019 trasmissione elaborati fase 4
2019-fase II piste PON METRO (c.o. 160036): esecuzione della procedura di gara		01/11/2019	30/10/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	DD 5493/2020
2019-avvio realizzazione lavori della ciclopista dell'Arno - tratto lungarno vespucci		01/07/2019	30/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2019-realizzazione posti sosta per bike sharing		31/01/2019	31/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2019-progettazione definitiva pista ciclabile di Via Canova		01/04/2019	28/02/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	come da mail del progettista ing. Nistri
2019-installazione rastrelliere ed interventi manutentivi piste ciclabili		01/01/2019	31/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	avanzamento accordo quadro c.o. 170430
2019 - Sviluppo progetto Bicipolitana		01/01/2019	31/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2020- realizzazione interventi manutenzione straordinaria di piste ciclabili - interventi con C.O. 170162		01/04/2020	31/12/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2020 - fase V e VI piste PON METRO (c.o. 1600VI82): progettazione		01/03/2020	31/12/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	c.o. 170240 approvatop esecutivo
2020 - realizzazione lavori piste pon metro fase 2 (c.o. 160082)		01/04/2020	30/06/2021		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	con DD 10801/2020 si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto avviando la fase esecutiva
2020 - realizzazione lavori piste pon metro fase 3 (c.o. 160083)		01/04/2020	31/12/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	appalto aggiudicato impresa D.F. strade SrL
2020 - Sviluppo progetto Bicipolitana		01/03/2020	31/12/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	

2019\_ZG20P21

Obiettivo pluriennale Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2020 - realizzazione lavori piste pon metro fase 4 (c.o. 160084)		01/04/2020	31/12/2020		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	appalto aggiudicato impresa Berti Sisto DD 3509/2020
supporto alla città metropolitana per la realizzazione della superstrada ciclabile		01/04/2020	31/12/2020	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	prot.141366_20-parere progetto definitivosuperstrada FIPO
progettazione interventi connesse con monetizzazioni piano di recupero		01/04/2020	31/12/2020	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	Ats Via Madonna della Tosse - DD 11060/2020 "Interventi per la mobilità sostenibile. Realizzazione di pista ciclabile in via Erbosa e riqualificazione del Percorso Ciclabile di via Giovanni Pascoli, largo Adone Zoli e via Mafalda di Savoia" CC.OO. n° 1
Completamento lavori appalto Fase III pon metro - codice opera 160083		01/03/2021	30/05/2021	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Completamento lavori appalto Fase IV pon metro - codice opera 160084		01/03/2021	30/05/2021	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Realizzazione interventi manutenzione pista Ciclabili Erbosa, Adone Zoli, Pascoli		01/04/2021	30/09/2021	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Approvazione progetto definitivo ciclovie urbane fase I		01/03/2021	30/08/2021	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	- Via Circondaria - Via Pompeo Neri - Via delle Porte Nuove - Via Toselli

**2019\_ZG20P21**
**Obiettivo pluriennale Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile**

<b>FASI</b>						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Approvazione progetto definitivo ciclovie urbane fase II		01/03/2021	30/08/2021	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	- Via Allori - Via della torre degli Agli Delibera di Giunta n. 321/2021
Emissione bando concessione servizio bike sharing		01/03/2021	30/07/2021		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	DD 3642/2021 -aggiudicazione abndo bike sharing a RideMovi ed assunzione impegno di spesa
Installazione e manutenzione rastrelliere		01/03/2021	31/12/2021		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Approvazione progetti preliminari linee bicipolitana		01/03/2021	31/12/2021	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	

<b>INDICATORI</b>		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2019-N. installazione posti bici	RISULTATO	1.000,00
2019-Realizzazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml)	RISULTATO	500,00
2019-progettazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml)	RISULTATO	4.000,00
2019-programmazione interventi progetto Bicipolitana	RISULTATO	1
2019 - manutenzione piano rotolamento percorsi ciclabili (sviluppo in km)	RISULTATO	1
2020-N. installazione posti bici	RISULTATO	300
2020-Realizzazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml)	RISULTATO	1500
2020 -progettazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml)	RISULTATO	2000
2020 - REALIZZAZIONE interventi progetto Bicipolitana	RISULTATO	3
2020 - manutenzione piano rotolamento percorsi ciclabili (sviluppo in ml)	RISULTATO	1500
2020 - Conferenze dei servizi per approvazione progetti	RISULTATO	2
2021 - progettazione nuovi percorsi ciclabili (ml)	RISULTATO	3000

2019\_ZG20P21

Obiettivo pluriennale Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2021 - realizzazione interventi manutenzione (ml)	RISULTATO	500
2021 - installazione e manutenzione rastrelliere (posti bici)	RISULTATO	400
2021 - realizzazione nuovi percorsi ciclabili (ml)	RISULTATO	3500
