COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2018_ZL21P21 **Obiettivo pluriennale. Analisi e sviluppo nuovi applicativi software per l'informatizzazione del Servizio Sport**

Direzione	**CULTURA E SPORT**	Direttore	**FARSI GABRIELLA**	Classificazione	**INTERDIREZIONALE**
Servizio	**SPORT**	Dirigente	**DE PONTI CARLA**	Tipologia	**SVILUPPO**

Collegato a
***INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.*:** 2021_IND_STRATEG_10 FIRENZE 2030 E LO SPORT
***OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.*:** 2021_10_IS_OB_STR_02 POTENZIARE LO SPORT PER TUTTI

Obiettivo Operativo del D.U.P. 13.1.21

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Obiettivo pluriennale nato nel 2018.
Nel 2021 l'obiettivo prevede il popolamento del nuovo software per la gestione delle concessioni degli impianti sportivi comunali [Pericle], mediante l'inserimento - lato back office - dei dati e della documentazione (di gara, contrattuale, contabile e gestionale) relativa agli impianti in concessione affidati con le nuove gare a partire dal 2018.
L'attività propedeutica al popolamento del software consisterà, oltre che nella formazione a cura della Direzione Sistemi Informativi, nella verifica e aggiornamento della documentazione conservata in atti relativa a ciascun impianto.
Inoltre, nel corso del 2021 sarà avviata l'acquisizione on line delle richieste di spazi ad uso sportivo tramite il software Aspasia-webform.

DIREZIONI COINVOLTE

Descrizione
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione
BONINSEGNI CLAUDIO	Personale assegnato all'obiettivo
VENTRONI ENZO P.O.AMMINISTRATIVA SPORT	Personale assegnato all'obiettivo
SALVINI ELISABETTA	Personale assegnato all'obiettivo
PERGOLIZZI GIANFRANCESCO -P.O. CONTABILE SPORT	Personale assegnato all'obiettivo
MONASTA GIULIO	Personale assegnato all'obiettivo
GAVAZZI PAOLA	Personale assegnato all'obiettivo

COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2018_ZL21P21 **Obiettivo pluriennale. Analisi e sviluppo nuovi applicativi software per l'informatizzazione del Servizio Sport**

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione
FINI ROBERTO	Personale assegnato all'obiettivo
CARDOSI ANDREA	Personale assegnato all'obiettivo
CAPPELLETTI MARIA GRAZIA	Personale assegnato all'obiettivo
TANZI GIANLUCA	Personale assegnato all'obiettivo
PESCINI PAOLO	Partecipante
MASINI MANUELA	Partecipante
CARNASCIALI FABIO	Partecipante
BERTELLI LUCA - P.O. DATA CENTER E SISTEMI CLOUD	Partecipante
PICARIELLO	Partecipante
ROSSI GIOVANNI - P.O. SVILUPPO PROGETTI AZIENDALI	Partecipante
MANZI ANDREA	Partecipante

COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2018_ZL21P21 **Obiettivo pluriennale. Analisi e sviluppo nuovi applicativi software per l'informatizzazione del Servizio Sport**

GANTT

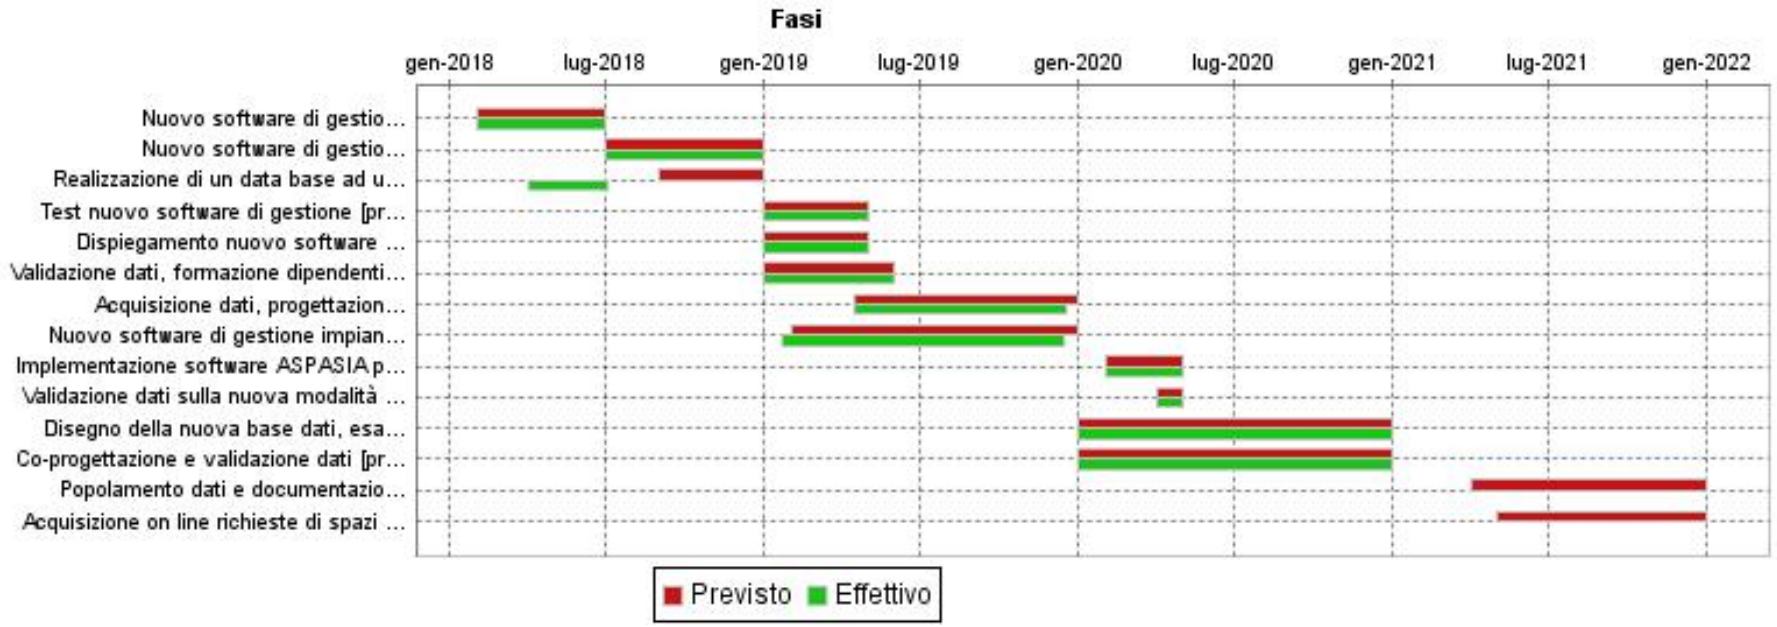

FASI - ATTIVITA'

FASE	Nuovo software di gestione dell'assegnazione in uso di spazi all'interno degli impianti sportivi comunali [prg. ASPASIA]: raccolta ed analisi dei requisiti (individuazione specifiche funzionali), a partire dalle specifiche dell'applicativo esistente. Analisi dei dati esistenti e valutazione tempi di migrazione.					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**				
	01/02/2018	30/06/2018		100,00	DE PONTI CARLA	SERVIZIO SPORT
	01/02/2018	30/06/2018				
Note						

COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2018_ZL21P21 Obiettivo pluriennale. Analisi e sviluppo nuovi applicativi software per l'informatizzazione del Servizio Sport

FASE	**Nuovo software di gestione dell'assegnazione in uso di spazi all'interno degli impianti sportivi comunali: disegno della nuova base dati, esame interazioni applicative, specifiche e progettazione tecnica, capacity planning**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/07/2018	31/12/2018		100,00	FEMIA BENEDETTO	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
	01/07/2018	31/12/2018				
Note						
FASE	**Realizzazione di un data base ad uso interno in formato excel per la gestione degli impianti sportivi in concessione**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/09/2018	31/12/2018		100,00	DE PONTI CARLA	SERVIZIO SPORT
	01/04/2018	01/07/2018				
Note						
FASE	**Test nuovo software di gestione [prg. ASPASIA]: invio schede alle società sportive per acquisizione dati anagrafici e dati relativi alla fatturazione elettronica**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/01/2019	30/04/2019		100,00	DE PONTI CARLA	SERVIZIO SPORT
	01/01/2019	30/04/2019				
Note						
FASE	**Dispiegamento nuovo software di gestione [prg. ASPASIA] e attivazione servizio telematico per le società sportive**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/01/2019	30/04/2019		100,00	FEMIA BENEDETTO	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
	01/01/2019	30/04/2019				
Note						
FASE	**Validazione dati, formazione dipendenti e informazione alle società sportive sul nuovo software ASPASIA**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/01/2019	31/05/2019		100,00	DE PONTI CARLA	SERVIZIO SPORT
	01/01/2019	31/05/2019				

2018_ZL21P21 Obiettivo pluriennale. Analisi e sviluppo nuovi applicativi software per l'informatizzazione del Servizio Sport

Note						
FASE	**Acquisizione dati, progettazione, sviluppo, test e dispiegamento modulo per la fatturazione degli spazi**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	15/04/2019	31/12/2019		100,00	DE PONTI CARLA	SERVIZIO SPORT
	15/04/2019	17/12/2019				
Note						
FASE	**Nuovo software di gestione impianti sportivi in concessione: specifiche e progettazione tecnica [prg. PERICLE]**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/02/2019	31/12/2019		100,00	FEMIA BENEDETTO	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
	22/01/2019	15/12/2019				
Note						
FASE	**Implementazione software ASPASIA per l'acquisizione on line delle richieste di spazi negli impianti sportivi**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/02/2020	30/04/2020		100,00	FEMIA BENEDETTO	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
	01/02/2020	30/04/2020				
Note	La fase è stata realizzata come da previsione					
FASE	**Validazione dati sulla nuova modalità on line [software ASPASIA]**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/04/2020	30/04/2020		100,00	DE PONTI CARLA	SERVIZIO SPORT
	01/04/2020	30/04/2020				
Note	Validazione dati completata. Si propone di rinviare la fase di formazione dei dipendenti e informazione alle società sportive sulla nuova modalità on-line al 2021 in quanto per la stagione sportiva 2020/2021 la Giunta Comunale ha confermato le stesse asse					
FASE	**Disegno della nuova base dati, esame interazioni applicative, specifiche e progettazione tecnica, capcity planning [prg. PERICLE]**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/01/2020	31/12/2020		100,00	FEMIA BENEDETTO	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
	01/01/2020	31/12/2020				

COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2018_ZL21P21 Obiettivo pluriennale. Analisi e sviluppo nuovi applicativi software per l'informatizzazione del Servizio Sport

Note						
FASE	**Co-progettazione e validazione dati [prg. PERICLE]**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/01/2020	31/12/2020		100,00	DE PONTI CARLA	SERVIZIO SPORT
	01/01/2020	31/12/2020				
Note						
FASE	**Popolamento dati e documentazione relativa agli impianti sportivi in concessione**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/04/2021	31/12/2021	70,00		DE PONTI CARLA	SERVIZIO SPORT
Note						
FASE	**Acquisizione on line richieste di spazi ad uso sportivo**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/05/2021	31/12/2021	30,00		DE PONTI CARLA	SERVIZIO SPORT
Note						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2018 ASPASIA: Progetto nuovo applicativo completato	RISULTATO	31/12/2018	31/12/2018
2018 Realizzazione data base ad uso interno per la gestione degli impianti sportvi in concessione	RISULTATO	31/12/2018	31/12/2018
2019 ASPASIA: dispiegamento nuovo software e inizio attivazione servizio telematico	RISULTATO	30/04/2019	30/04/2019
2019 ASPASIA: dispiegamento modulo per la fatturazione informatica degli spazi	RISULTATO	31/12/2019	17/09/2019
2019 ASPASIA: numero società sportive partecipanti agli incontri di formazione/totale società sportive assegnatarie di spazi	PERFORMANCE	100/300	180/286
2019 ASPASIA: n° domande società sportive gestiste telematicamente/ n° domande complessive pervenute	PERFORMANCE	100%	286/286
2019 PERICLE: specifiche e progettazione tecnica completata	RISULTATO	31/12/2019	15/12/2019

COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2018_ZL21P21 **Obiettivo pluriennale. Analisi e sviluppo nuovi applicativi software per l'informatizzazione del Servizio Sport**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
2020 PERICLE: progetto nuovo applicativo completato	RISULTATO	31/12/2020	31/12/2020
2020 Implementazione software ASPASIA per l'acquisizione on line delle richieste di spazi negli impianti sportivi: rispetto tempi	RISULTATO	30/04/2020	30/04/2020
2021 ASPASIA webform: numero richieste gestite on line	RISULTATO	100%	
2021 PERICLE: popolamento dati e documenti impianti in concessione	RISULTATO	20%	
